Meilensteinplan

Radwegneubau K315 - Frielingen - Otternhagen

	Was ist zu tun?	Erfüllungsgrad	Wer? Verantwortlich
	Meilensteine		
	Meilenstein 1: Durchführung Planungsanlaufbesprechung		
	Meilenstein 2: Vorplanung (Lph. 2) abgeschlossen		
	Meilenstein 3: Entwurfsplanung (Lph.3) ist abgeschlossen		
	Meilenstein 4: Die Plangenehmigung ist abgeschlossen		
	Meilenstein 5: Ausführungsplanung (Lph.5) ist abgeschlossen		
	Meilenstein 6: Leistungsphase 6 ist abgeschlossen		
	Meilenstein 7: Baubeginn		
	Meilenstein 8: Bauende		
	Kick-Off		
1.1	Erstellen aller Vergabeuntelagen und Übergabe an Vergabe		PL
1.2	Durchführung der Vergabe		Beschaffung
1.3	Vorbereitung der Planungsanlaufbesprechung		PL
1.4	Durchführung Planungsanlaufbesprechung		PL
1	**Meilenstein 1: Durchführung Planungsanlaufbesprechung**		
2.1	Auftaktermin zur Lph. 2 mit Ing.- Büro		PL
2.2	Durchführung der Vermessungsleistung		ING
2.3	Durchführung der Kartierung (ggf. Verlängerung notwendig)		ING
2.6	Durchführung der Baugrunduntersuchung		ING
2.4	Variantenuntersuchung		PL/ING
2.5	Ggf. Abstimmung der Varianten mit weiteren Projektbeteiligten		PL
2.6	Einarbeitung der Änderungen, dann ggf. erneut Abstimmung, einarbeitung etc.		ING
2.7	Vorstellen der Vorzugsvariante im Ortsrat		PL/ING/KOM
2.8	Projektleiter und Auftraggeber wählen eine Vorzugsvariante aus.		PL
2.9	Weiterbeauftragung wird durchgeführt - Grundlage ist Kostenschätzung		PL
2	**Meilenstein 2: Vorplanung (Lph. 2) abgeschlossen**		
3.1	Kick-Off zur Entwurfsplanung mit Grunderwerb und Landschaftsplaner		PL
3.2	Bilanzierung und Erstellen LBP		ING
3.3	Untersuchung der UVP-Pflicht		ING
3.4	Erwerb/Suche nach Ausgleichsflächen		GE
3.5	Aufstellen Grunderwerbspläne und Übergabe (Vorabzug)		ING
3.6	Grunderwerb wird durchgeführt		GE
3.7	Leitungsträger informieren inkl. Abstimmung?		PL
3.8	Erstellen der Entwurfsplanung ggf. mit weiteren Projektbeteiligten		ING
3.9	Erstellen der Kostenberechnung - Mittelverfügbarkeit Rücksprache		ING
3.10	ggf. Erneute Präsentation im Ortsrat		PL/ING
3	**Meilenstein 3: Entwurfsplanung (Lph.3) ist abgeschlossen**		
4.1	Kick-Off Lph. 4 (ggf. mit Planfeststellungsbehörde)		PL
4.2	Erstellen der Genehmigungsunterlagen inkl. UVP Prüfkatalog		ING
4.3	Vorprüfung der Unterlagen durch UNB/UWB/Planfeststellung		UNB/UWB
4.4	Einreichen der Unterlagen für das Offizielle Verfahren		PL
4.5	Durchführung Anhörungsverfahren		63
4.6	Beantwortung der Stellungnahmen von Betroffenen		ING
4.7	Prüfung und Abwägung der Plangenehmigungsbehörde		63
4.8	Rechtskräftiger Beschluss liegt vor		63
4.9	Weiterbeauftragung prüfen und durchführen		PL
4	**Meilenstein 4: Die Plangenehmigung ist abgeschlossen**		
5.1	Kick-Off der Ausführungsplanung		PL
3.1	Erstellen Vereinbarung und Abstimmung mit Kommune (falls nötig)		PL
5.2	Leitungsträger informieren inkl. Abstimmung?		PL
5.3	Erstellen Ausführungsplanung		ING
5.4	Freigabe Ausführungplanung durch Kommune und Region		PL/KOM
5.4	Übergabe Projektleitung an Bauteam		PL
5	**Meilenstein 5: Ausführungsplanung (Lph.5) ist abgeschlossen**		
6.1	Erstellen LV inkl. Preisen		ING
6.2	Mittelverfügbarkeit kontrollieren? (Bei Kostensteigerung)		PL
6.3	Prüfung LV		PL
6.4	Freigabe LV durch Kommune und Region		PL/KOM
6.5	Zusammenstellung Unterlagen und Übergabe an Beschaffung		PL
6	**Meilenstein 6: Leistungsphase 6 ist abgeschlossen**		
7.1	Ausschreibung veröffentlichen		PL
7.2	Durchführung der Vergabe		PL
7	**Meilenstein 7: Baubeginn**		
8.1	Hier auf den Bauablaufplan zurückgreifen		PL
	Meilenstein 8: Bauende		

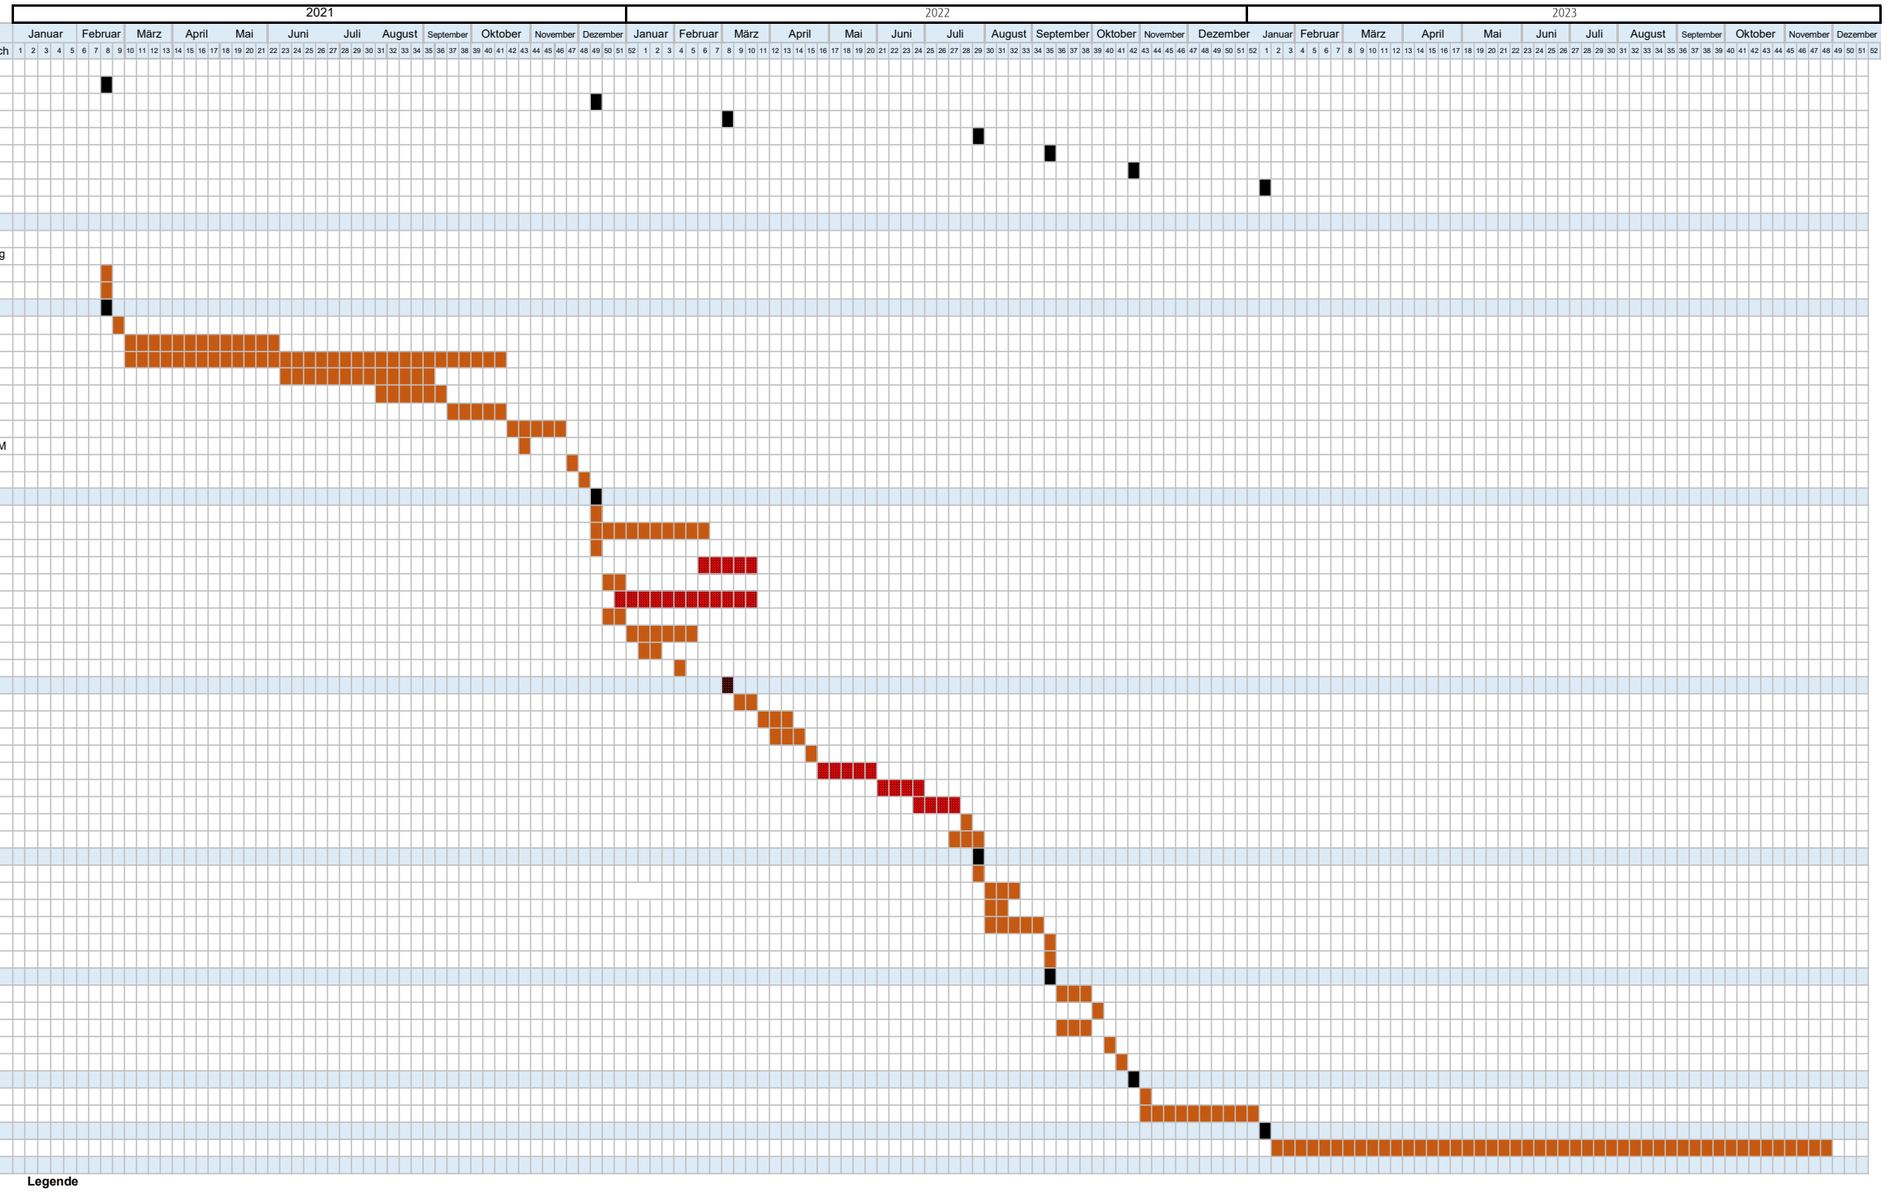

Legende

AG = Auftraggeber
PL = Projektleiter
ING= Ingenieurbüro Verke
KOM= Kommune

Zeitraum der Bearbeitung eines Arbeitspakets
Die Länge der Bearbeitung dieses Arbeitspakets unterliegt großen Risiken
Meilenstein
