



**1. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung Beckum**

Der Sachstandsbericht gibt einen Überblick über den zeitlichen Verlauf der Projektumsetzung. Zu diesem Zweck sind zu den einzelnen Blöcken jeweils die Roadmap nach der ursprünglichen Planung, der aktuelle Stand sowie der aktuelle Planungsstand dargestellt. Er schließt mit einer Übersicht über den aktuellen Planungsstand für die weiteren Projektverläufe ab.

**1 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems**

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>DMS</i>														
<i>DMS Beschaffung und Einrichtung</i>														
<i>Pilotprojekt</i>														
<i>Anbindung Finanzsoftware</i>														
<i>Folgeprojekt</i>														
<i>Flächenausbreitung - digitaler Aktenplan</i>														
<i>Abbildung elektronischer Workflows</i>														
<i>sukzessive Prozessdigitalisierung</i>														

Im Plan	Verzug	Planmäßiger Beginn realistisch	Planmäßiger Beginn Nicht realistisch
DMS Beschaffung			
	Pilotprojekt		
Anbindung Finanzsoftware			
		Folgeprojekt	
		Flächenausbreitung	
	Elektronische Workflows (Verfügungsworkflow)		
		Sukzessive Prozessdigitalisierung	

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>DMS</i>														
<i>DMS Beschaffung und Einrichtung</i>														
<i>Pilotprojekt</i>														
<i>Anbindung Finanzsoftware</i>														
<i>Folgeprojekt</i>														
<i>Flächenausbreitung - digitaler Aktenplan</i>														
<i>Abbildung elektronischer Workflows</i>														
<i>sukzessive Prozessdigitalisierung</i>														

## 2 Einführung einer digitalen Poststelle

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>digitale Poststelle</i>														
Einführung digitaler Posteingang														
Prüfung digitaler Postausgang														


Im Plan	Verzug	Planmäßiger Beginn realistisch	Planmäßiger Beginn Nicht realistisch
	Einführung digitaler Posteingang (nur bedingt, Parallelverzug mit Pilotprojekt DMS)		
		Einführung digitaler Postausgang	

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>digitale Poststelle</i>														
Einführung digitaler Posteingang														
Prüfung digitaler Postausgang														

## 3 Umsetzung virtuelles Rathaus

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>virtuelles Rathaus</i>														
e-Bezahlverfahren														
Überarbeitung Internetauftritt														
Migration Serviceportal														
VOIS-Online														
OZG-Formularanbindung														

Im Plan	Verzug	Planmäßiger Beginn realistisch	Planmäßiger Beginn Nicht realistisch
e-Bezahlverfahren			
	Überarbeitung Internetauftritt		
Migration Serviceportal			
VOIS-Online			
OZG Formularanbindung			

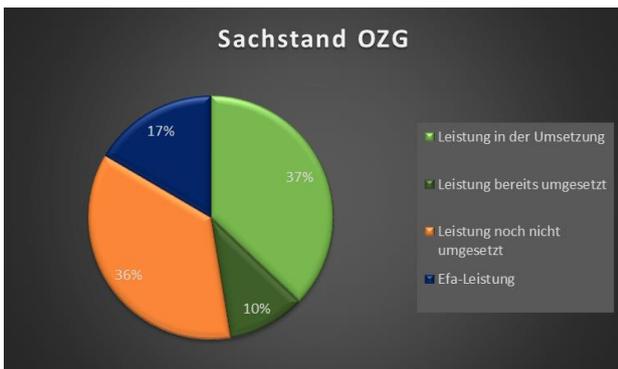









## 10 Roadmap

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>DMS</b>														
DMS Beschaffung und Einrichtung														
Pilotprojekt														
Anbindung Finanzsoftware														
Folgeprojekt														
Flächenausbreitung - digitaler Aktenplan														
Abbildung elektronischer Workflows														
sukzessive Prozessdigitalisierung														
<b>digitale Poststelle</b>														
Einführung digitaler Posteingang														
Prüfung digitaler Postausgang														
<b>virtuelles Rathaus</b>														
e-Bezahlverfahren														
Überarbeitung Internetauftritt														
Migration Serviceportal														
VOIS-Online														
OZG-Formularanbindung														
<b>digitale Baugenehmigung</b>														
Anschluss an das Bauportal														
Entgegennahme der Antragsdaten														
Scannen der Bau-Akten														
Einführung DMS														
Antragsdaten & anliegende Bauvorlagen														
<b>Organisationsentwicklung</b>														
Erstellung des Leitfadens Personalentwicklung														
Maßnahmen Umsetzung														
Überarbeitung Raumkonzept														
Modernisierung Besprechungsräume														
Weiterentwicklung zeitliche und örtliche Flexibilisierung														
<b>Hardware-Ausstattung</b>														
Konzeptentwicklung														
Umsetzung														
<b>Erweiterung von (bestehenden) Fachanwendungen</b>														
Projektmanagement-Tool														
Grünflächenkataster														
<b>digitaler Fachdienst Personal</b>														
Mitarbeiterportal														
papierlose Anträge														
Einführung digitales Bewerbungsportal														
<b>Zukunftsthemen</b>														
Identifikation potentieller Trend-Themen														
Geoinformationsportal														
Überarbeitung Digitalisierungsstrategie														

im Auftrag  
gezeichnet  
Igor Suspicion 04.09.2023
