


# Sachstandsbericht zur Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung Beckum

1. Berichterstattung im HUFA 27.09.2023



# 1. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>DMS</b>														
DMS Beschaffung und Einrichtung														
Pilotprojekt														
Anbindung Finanzsoftware														
Folgeprojekt														
Flächenausbreitung - digitaler Aktenplan														
Abbildung elektronischer Workflows														
sukzessive Prozessdigitalisierung														

Im Plan	Verzug	Planmäßiger Beginn realistisch	Planmäßiger Beginn Nicht realistisch
DMS Beschaffung			
	Pilotprojekt		
Anbindung Finanzsoftware			
		Folgeprojekt	
		Flächenausbreitung	
	Elektronische Workflows		
		Sukzessive Prozessdigitalisierung	

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>DMS</b>														
DMS Beschaffung und Einrichtung														
Pilotprojekt														
Anbindung Finanzsoftware														
Folgeprojekt														
Flächenausbreitung - digitaler Aktenplan														
Abbildung elektronischer Workflows														
sukzessive Prozessdigitalisierung														

## 2. Einführung einer digitalen Poststelle



	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>digitale Poststelle</i>														
<i>Einführung digitaler Posteingang</i>														
<i>Prüfung digitaler Postausgang</i>														

Im Plan	Verzug	Planmäßiger Beginn realistisch	Planmäßiger Beginn Nicht realistisch
	Einführung digitaler Posteingang (Parallelverzug mit Pilotprojekt DMS)		
		Einführung digitaler Postausgang	

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>digitale Poststelle</i>														
<i>Einführung digitaler Posteingang</i>														
<i>Prüfung digitaler Postausgang</i>														



# OZG Umsetzungsstand

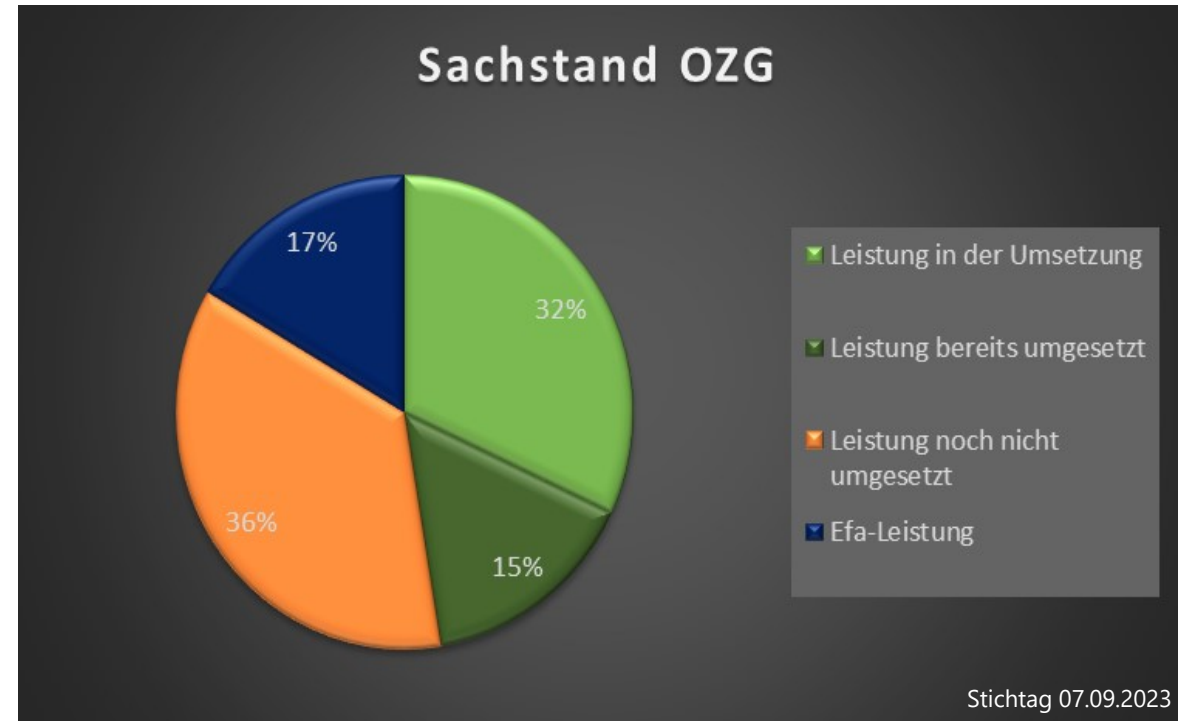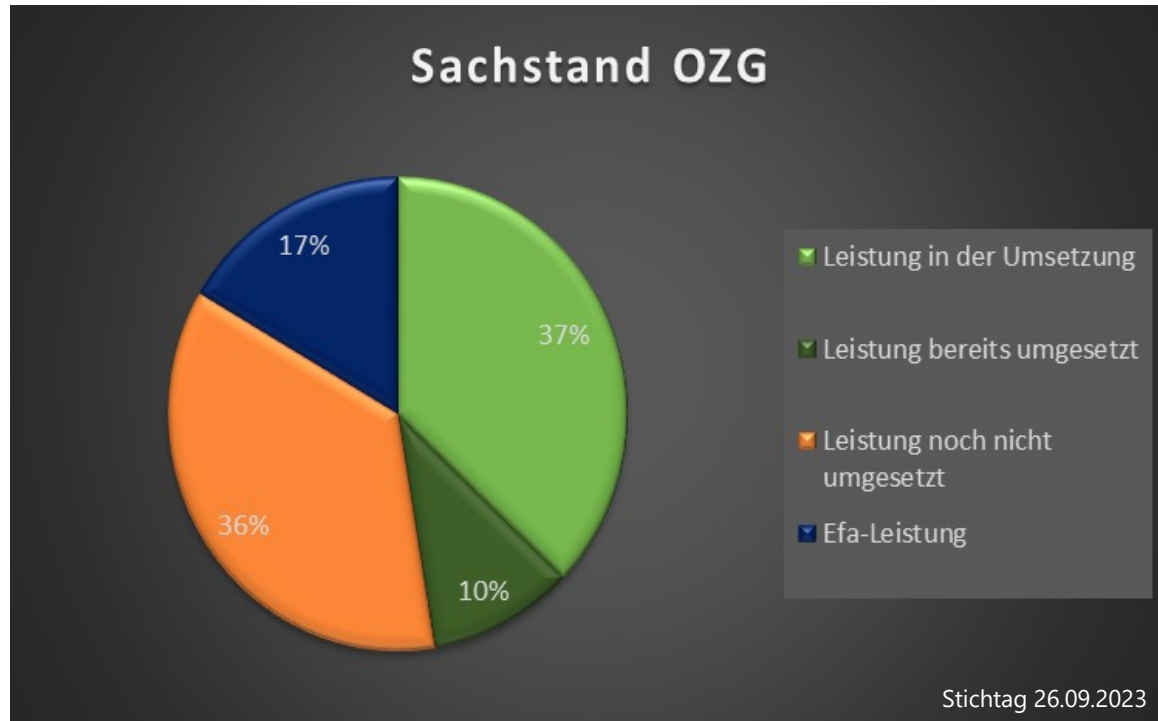



## 5. Organisationsentwicklung

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Organisationsentwicklung</b>														
<i>Erstellung des Leitfadens Personalentwicklung</i>														
<i>Maßnahmen Umsetzung</i>														
<i>Überarbeitung Raumkonzept</i>														
<i>Modernisierung Besprechungsräume</i>														
<i>Weiterentwicklung zeitliche und örtliche Flexibilisierung</i>														

Im Plan	Verzug	Planmäßiger Beginn realistisch	Planmäßiger Beginn Nicht realistisch
	Erstellung des Leitfadens Personalentwicklung		
	Maßnahmen Umsetzung		
		Überarbeitung Raumkonzept	
Modernisierung Besprechungsräume			
		Weiterentwicklung zeitliche und örtliche Flexibilisierung	

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Organisationsentwicklung</b>														
<i>Erstellung des Leitfadens Personalentwicklung</i>														
<i>Maßnahmen Umsetzung</i>														
<i>Überarbeitung Raumkonzept</i>														
<i>Modernisierung Besprechungsräume</i>														
<i>Weiterentwicklung zeitliche und örtliche Flexibilisierung</i>														





## 7. Erweiterung von Fachanwendungen

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>Erweiterung von (bestehenden) Fachanwendungen</i>														
Projektmanagement-Tool														
Grünflächenkataster														

Im Plan	Verzug	Planmäßiger Beginn realistisch	Planmäßiger Beginn Nicht realistisch
Projektmanagement-Tool			
			Grünflächenkataster

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>Erweiterung von (bestehenden) Fachanwendungen</i>														
Projektmanagement-Tool														
Grünflächenkataster														



## 9. Zukunftsthemen

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Zukunftsthemen</b>														
<i>Identifikation potentieller Trend-Themen</i>														
<i>Überarbeitung Digitalisierungsstrategie</i>														

Im Plan	Verzug	Planmäßiger Beginn realistisch	Planmäßiger Beginn Nicht realistisch
		Identifikation potentieller Trend-Themen	
		Überarbeitung Digitalisierungsstrategie	

	2022		2023				2024				2025			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Zukunftsthemen</b>														
<i>Identifikation potentieller Trend-Themen</i>														
<i>Geoinformationsportal</i>														
<i>Überarbeitung Digitalisierungsstrategie</i>														

	2022		2023				2024				2025				
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
<b>DMS</b>															
DMS Beschaffung und Einrichtung															
Pilotprojekt															
Anbindung Finanzsoftware															
Folgeprojekt															
Flächenausbreitung - digitaler Aktenplan															
Abbildung elektronischer Workflows															
sukzessive Prozessdigitalisierung															
<b>digitale Poststelle</b>															
Einführung digitaler Posteingang															
Prüfung digitaler Postausgang															
<b>virtuelles Rathaus</b>															
e-Bezahlverfahren															
Überarbeitung Internetauftritt															
Migration Serviceportal															
VOIS-Online															
OZG-Formularanbindung															
<b>digitale Baugenehmigung</b>															
Anschluss an das Bauportal															
Entgegennahme der Antragsdaten															
Scannen der Bau-Akten															
Einführung DMS															
Antragsdaten & anliegende Bauvorlagen															
<b>Organisationsentwicklung</b>															
Erstellung des Leitfadens Personalentwicklung															
Maßnahmen Umsetzung															
Überarbeitung Raumkonzept															
Modernisierung Besprechungsräume															
Weiterentwicklung zeitliche und örtliche Flexibilisierung															
<b>Hardware-Ausstattung</b>															
Konzeptentwicklung															
Umsetzung															
<b>Erweiterung von (bestehenden) Fachanwendungen</b>															
Projektmanagement-Tool															
Grünflächenkataster															
<b>digitaler Fachdienst Personal</b>															
Mitarbeiterportal															
papierlose Anträge															
Einführung digitales Bewerbungsportal															
<b>Zukunftsthemen</b>															
Identifikation potentieller Trend-Themen															
Geoinformationsportal															
Überarbeitung Digitalisierungsstrategie															
