MASTERPLAN SCHULZENTRUM SÜD

17.05.2018
Ralf Pohlmann

SICHT.weise
ralf pohlmann : architekten
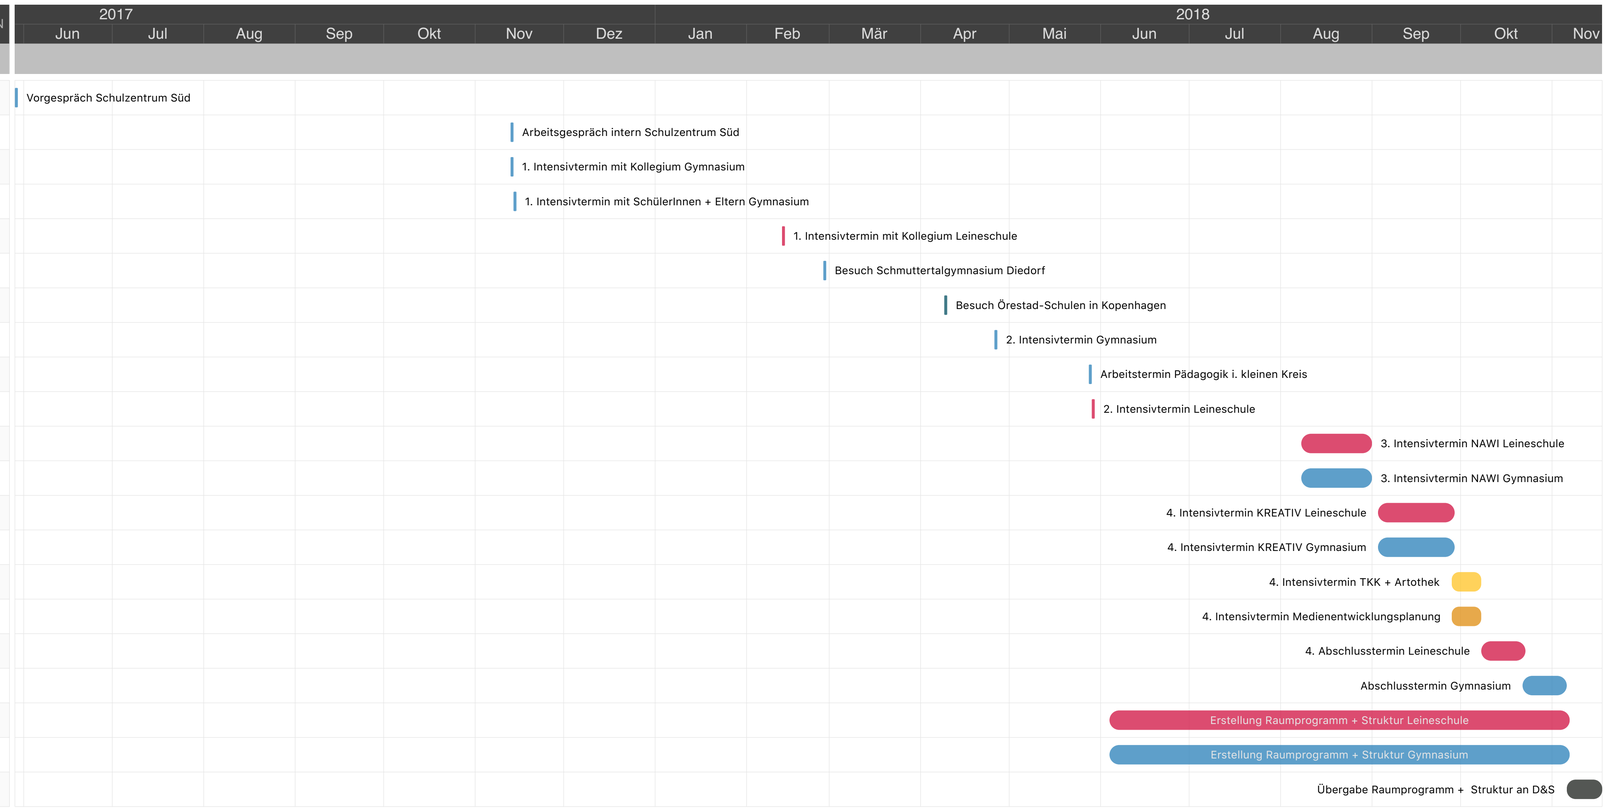
NR.	TASK	START	ENDE	DAUER		% FERTIGS...	RESOURCE	ICON
		29.05.2017	17.11.2018	538	385			
1	Vorgespräch Schulzentrum Süd	29.05.2017	29.05.2017	1	1			
2	Arbeitsgespräch intern Schulzentrum Süd	13.11.2017	13.11.2017	1	1			
3	1. Intensivtermin mit Kollegium Gymnasium	13.11.2017	13.11.2017	1	1			
4	1. Intensivtermin mit SchülerInnen + Eltern Gymnasium	14.11.2017	14.11.2017	1	1			
5	1. Intensivtermin mit Kollegium Leineschule	13.02.2018	13.02.2018	1	1			
6	Besuch Schmuttertalgymnasium Diedorf	27.02.2018	27.02.2018	1	1			
7	Besuch Örestad-Schulen in Kopenhagen	09.04.2018	09.04.2018	1	1			
8	2. Intensivtermin Gymnasium	26.04.2018	26.04.2018	1	1			
9	Arbeitstermin Pädagogik i. kleinen Kreis	28.05.2018	28.05.2018	1	1			
10	2. Intensivtermin Leineschule	29.05.2018	29.05.2018	1	1			
11	3. Intensivtermin NAWI Leineschule	08.08.2018	31.08.2018	24	18			
12	3. Intensivtermin NAWI Gymnasium	08.08.2018	31.08.2018	24	18			
13	4. Intensivtermin KREATIV Leineschule	03.09.2018	28.09.2018	26	20			
14	4. Intensivtermin KREATIV Gymnasium	03.09.2018	28.09.2018	26	20			
15	4. Intensivtermin TKK + Artothek	28.09.2018	07.10.2018	10	6			
16	4. Intensivtermin Medienentwicklungsplanung	28.09.2018	07.10.2018	10	6			
17	4. Abschlusstermin Leineschule	08.10.2018	22.10.2018	15	11			
18	Abschlusstermin Gymnasium	22.10.2018	05.11.2018	15	11			
19	Erstellung Raumprogramm + Struktur Leineschule	04.06.2018	06.11.2018	156	112			
20	Erstellung Raumprogramm + Struktur Gymnasium	04.06.2018	06.11.2018	156	112			
21	Übergabe Raumprogramm + Struktur an D&S	06.11.2018	17.11.2018	12	9
