



# Ausbauquerschnitt 3-3

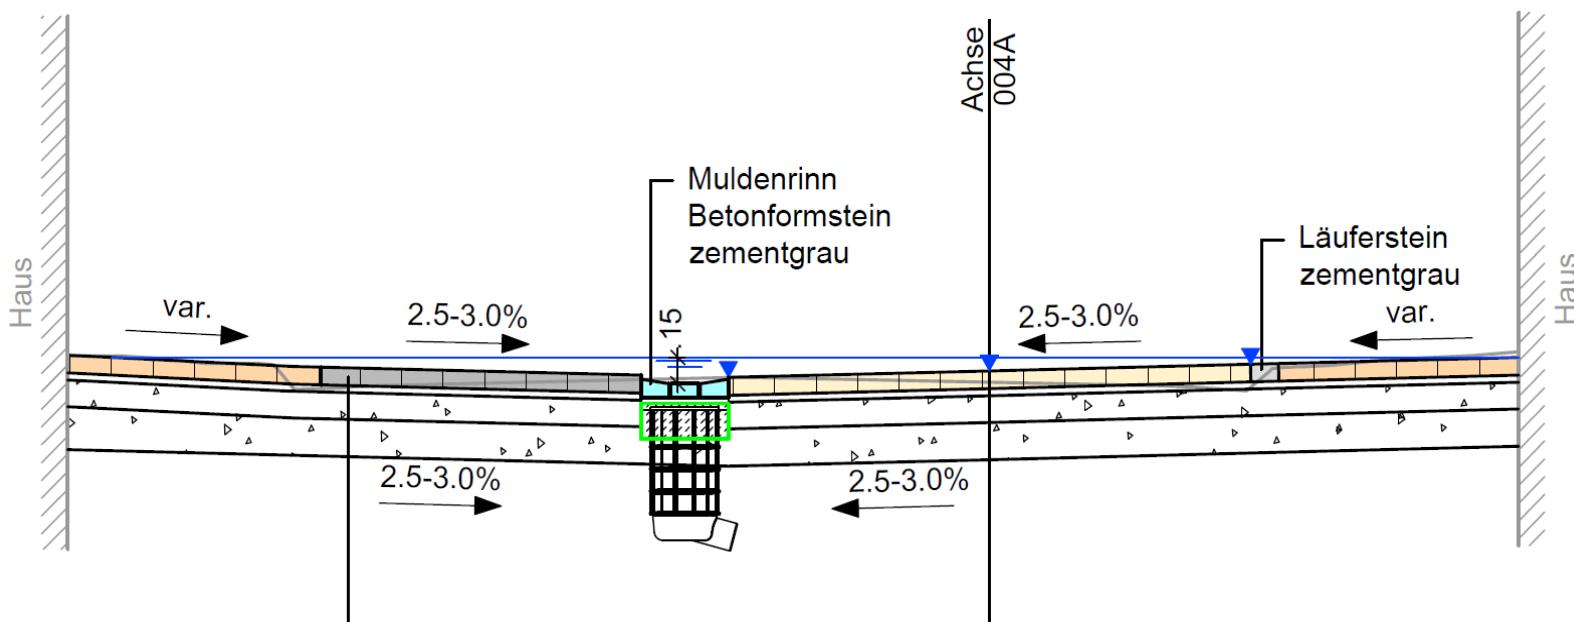


Deckenaufbau Parkstreifen  
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, BK 0.3:


- 10 cm Betonsteinpflaster, anthrazit
  - 4 cm Bettungsmaterial
  - 15 cm Schottertragschicht
  - 21 cm Frostschutzzschicht
  - 50 cm Gesamtdicke





# Ausbauquerschnitt 1-1

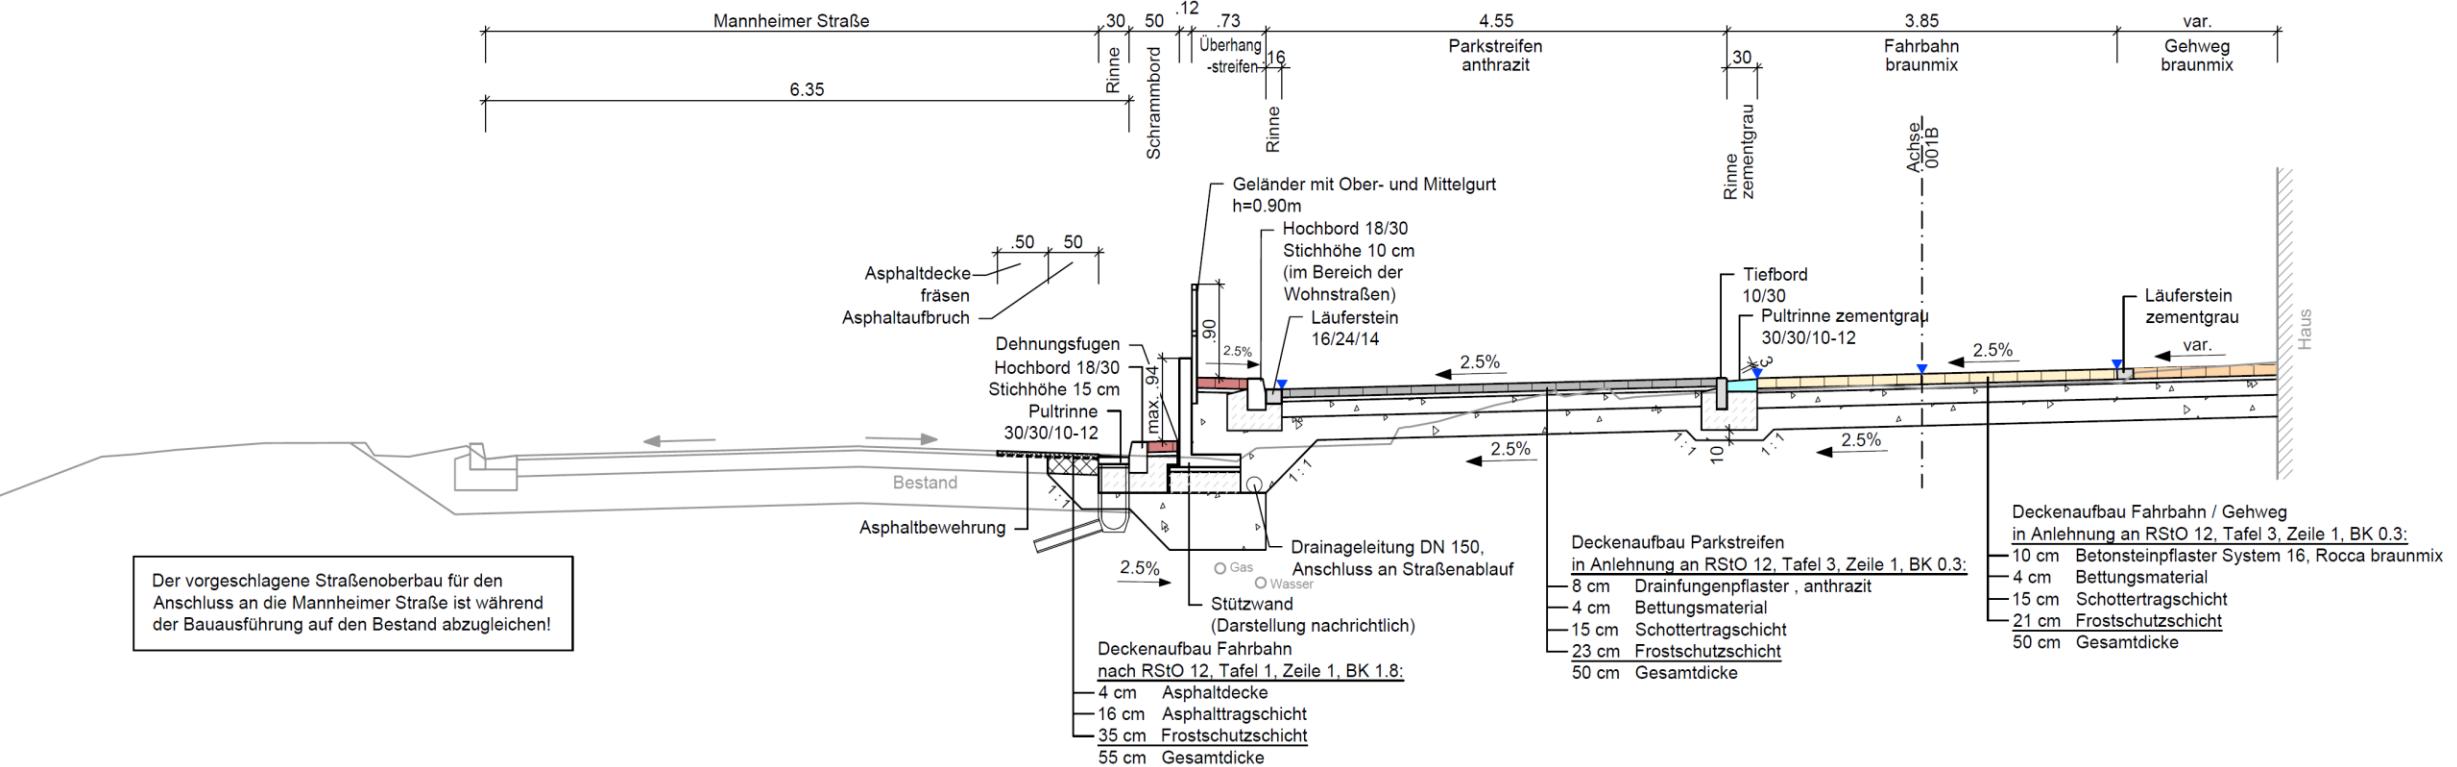

## Ausbauquerschnitt 2-2

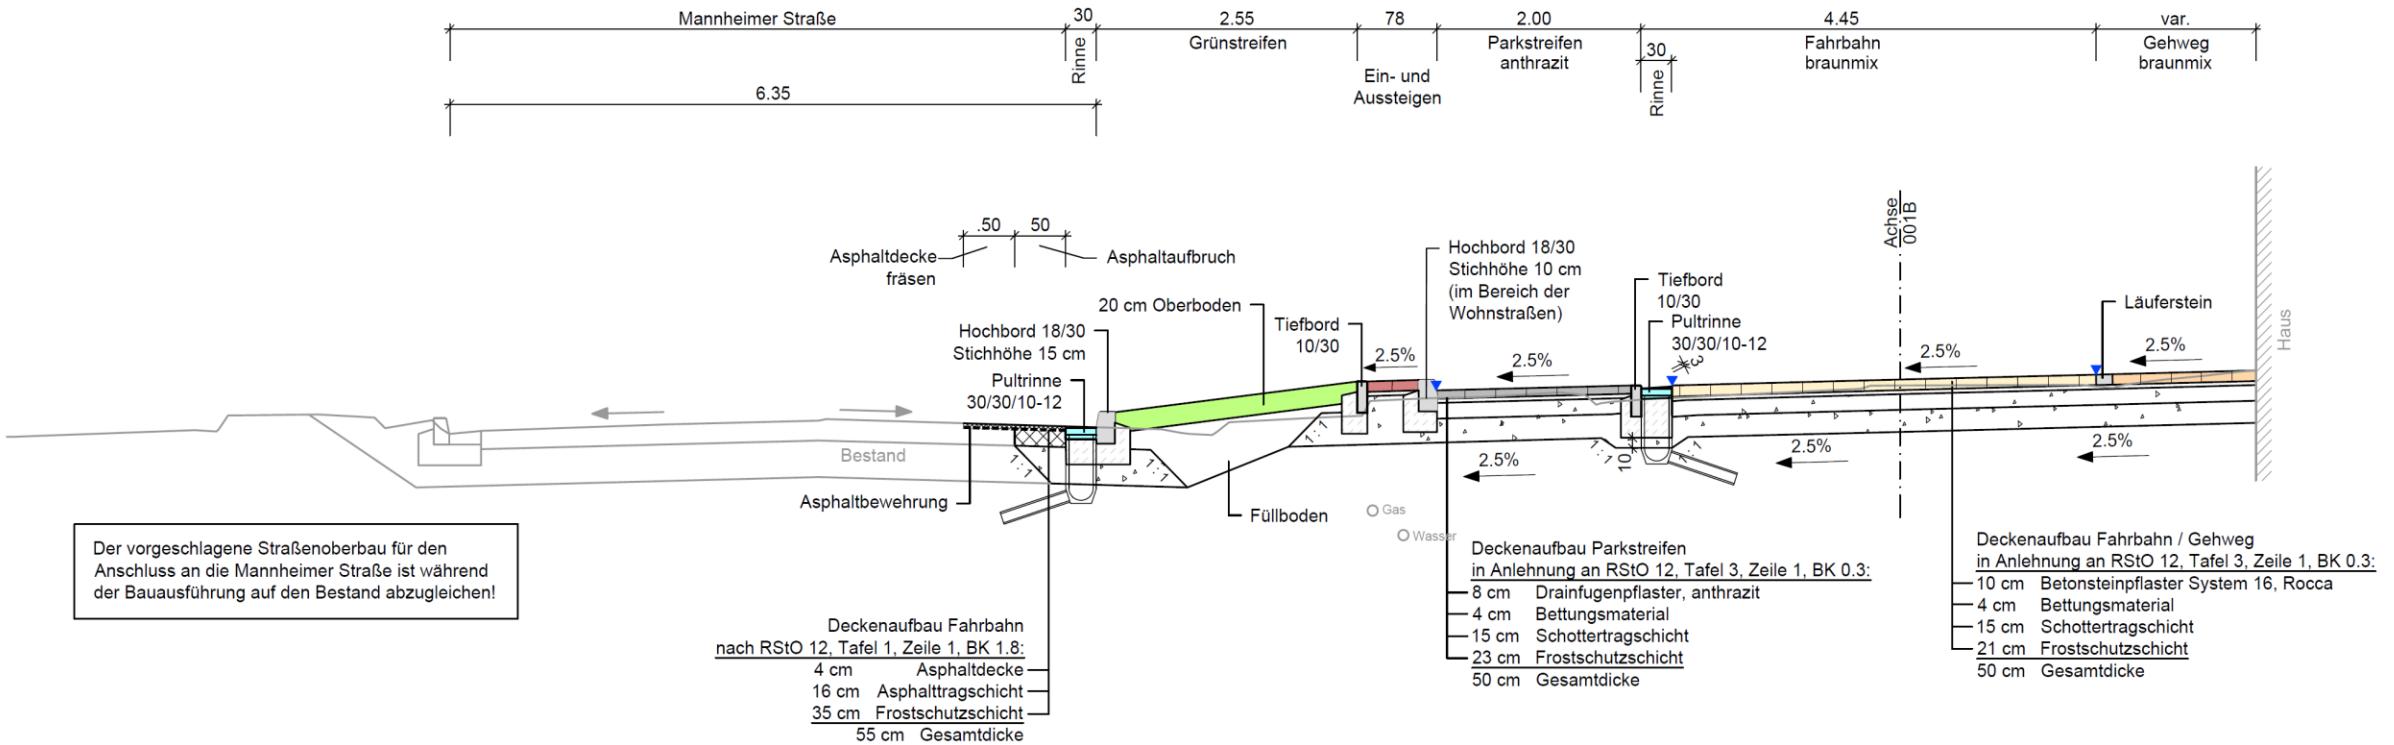

# Regeldetail Stützmauer

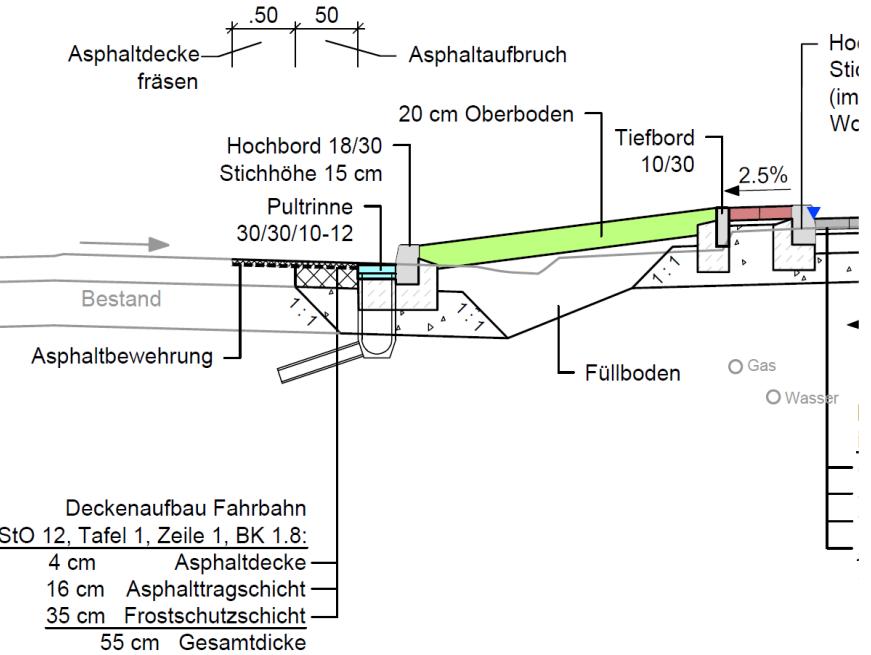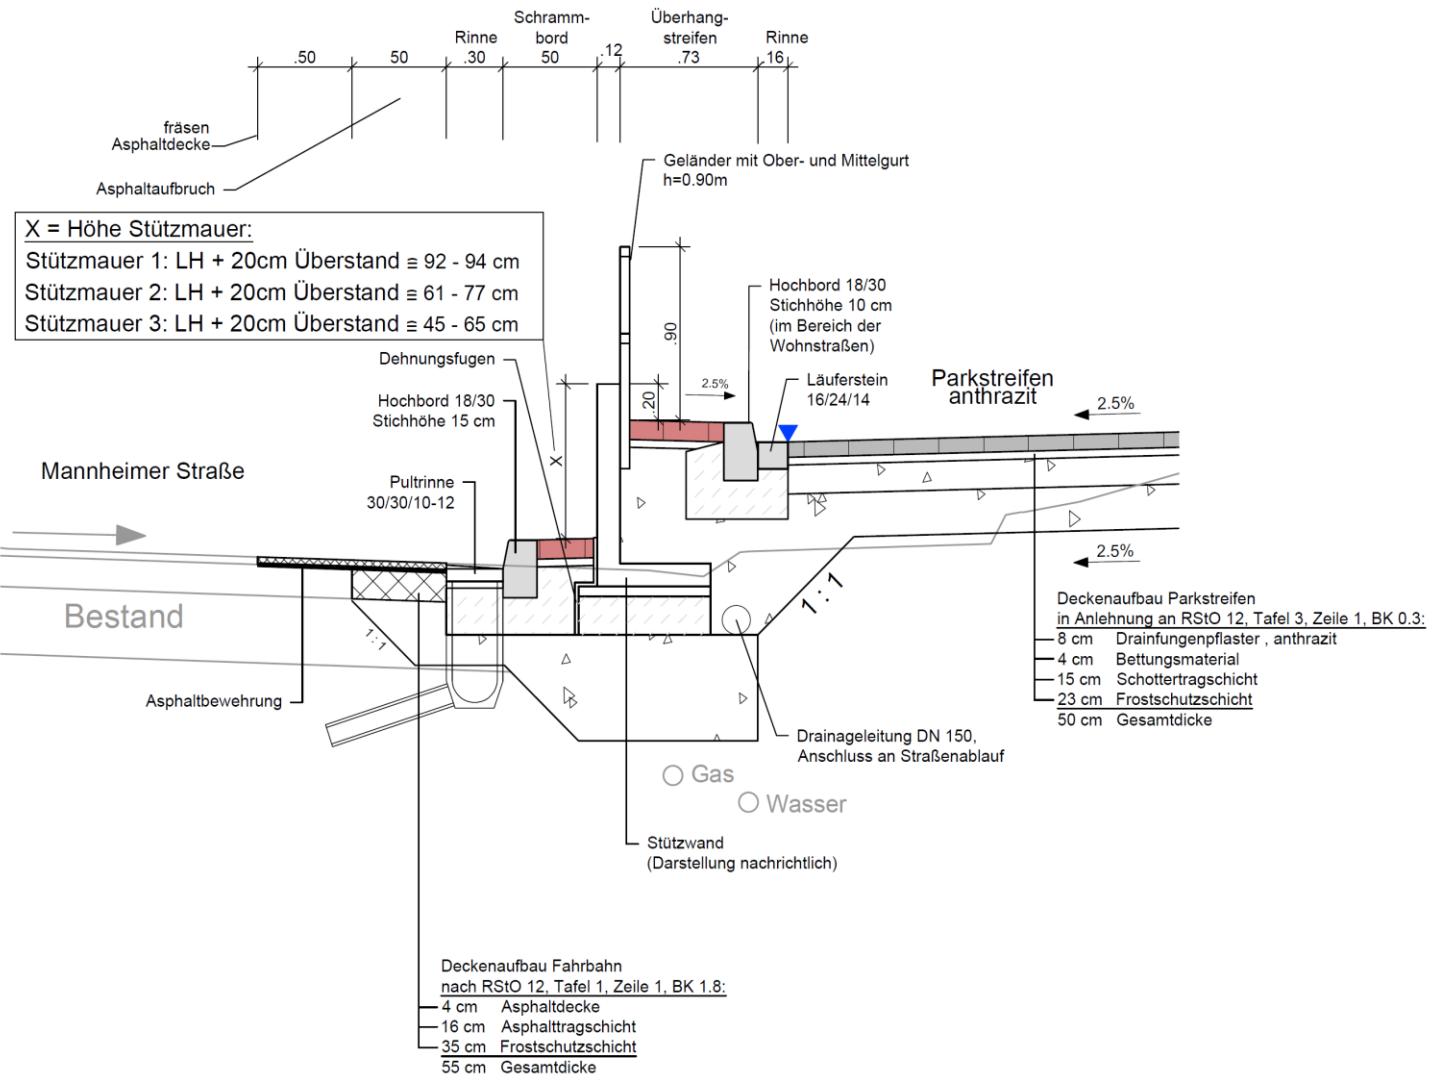

## Baubeginn

14.01.2019

Arbeitstage   Wochen

## Strang West (Haus Nr. 1 bis 13), inkl. Teilbereich entlang Mannheimer Straße

Aufbruch Verkehrsflächen	1300 m <sup>2</sup>	10	2
Notversorgung Gas / Wasser inkl. Hausanschlüsse		15	3
SW-Kanal inkl. Hausanschlüsse	103 m		
RW-Kanal inkl. Hausanschlüsse	94 m	45	9
RW-Kanal Schacht 3301050 bis 3301040 mit prov. Anschluss an vorh. Schacht	55 m		
Wasser- / Gasleitungen inkl. Hausanschlüsse	150 m	35	7
Verkehrsflächen herstellen, inkl. Teilbereich parallel Mannheimer Str.	1300 m <sup>2</sup>	40	8
		29	09.08.2019

## Strang Mitte (Haus Nr. 14 bis 29 und 46 bis 60) inkl. Teilbereich entlang Mannheimer Straße

Aufbruch Verkehrsflächen	1300 m <sup>2</sup>	9	2
Notversorgung Gas / Wasser inkl. Hausanschlüsse		20	4
SW-Kanal inkl. Hausanschlüsse	168 m		
RW-Kanal inkl. Hausanschlüsse	115 m	55	11
RW-Kanal Schacht 330100 bis 3301030 mit prov. Anschluss an vorh. Schacht	50 m		
Wasser- / Gasleitungen inkl. Hausanschlüsse	185 m	45	9
Verkehrsflächen herstellen, inkl. Teilbereich parallel Mannheimer Str.	1300 m <sup>2</sup>	35	7
		33	03.04.2020

## Strang Ost (Haus Nr. 30 bis 55) inkl. Restbereich entlang Mannheimer Straße, Stützwand und Parkplätze

Aufbruch Verkehrsflächen	1700 m <sup>2</sup>	10	2
Notversorgung Gas / Wasser inkl. Hausanschlüsse		20	4
SW-Kanal inkl. Hausanschlüsse	95 m	40	8
RW-Kanal inkl. Hausanschlüsse	155 m		
Wasser- / Gasleitungen inkl. Hausanschlüsse	170 m	40	8
Verkehrsflächen herstellen, inkl. Restbereich parallel Mannheimer Str., Stützwand und Parkplätze	1700 m <sup>2</sup>	60	12
		34	27.11.2020

Zu beachten ist, dass keine Winterunterbrechungen berücksichtigt sind, nur 2 Wochen Betriebsruhe über den Jahreswechsel 2019/2020 !

